



RAPPORT ANNUEL 2024

[Projet de Gestion Intégrée et Durable du Paysage de l'Aire Protégée du Complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI)]

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

Burkina Faso

[Novembre 2024]



Photo 1 : Cadre de concertation des acteurs de la gouvernance locale du complexe Pô-Nazinga-Sissili, prise de vue le 02/09/2024 par A W NIKIEMA, Ouagadougou

Période de reporting	Novembre 2024
Donateur	FEM ; PNUD
Pays	BURKINA FASO
Titre du projet	Projet de Gestion Intégrée et Durable du Paysage de l'Aire Protégée du Complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI)
Identifiant Quantum de projet Outputs Quantum Strategic Plan et/ou CPD Outcomes	
Marqueur genre	GEN 2 - 60% des bénéficiaires
Partenaire(s) de mise en œuvre)	SP / CNDD, DGEF, OFINAP, DRE, DREP, Collectivités territoriales
Date de début du projet	10 octobre 2023
Date de fin du projet	09 octobre 2029
Budget de PTA	703 208 USD
Ressources totales	5 549 452 USD
Ressources reçues	• 655 208 (USD) (FEM) • 48000 (USD) (PNUD) • 703 208 (USD)
Budget non financé	0 USD
Contacts	Diakouba SIRIMA Coordonnateur Adresse mail : dsirima.ponasi.bf@gmail.com Tél. : 00226 01889855 / 70 24 12 62

Table des matières

I.	Sommaire	4
II.	Introduction.	4
III.	Contexte de mise en œuvre du projet	5
IV.	Performance du projet sur la période couverte par le rapport.....	5
	i.) Efficacité dans la réalisation des activités.....	5
	ii) Efficacité dans la réalisation des produits « Key Results »	6
	iii) Changements obtenus au niveau Effet : analyse des indicateurs CPD et IRRF	16
	iv) Résultats et impacts dans le cadre de l'égalité des sexes et autonomisation des femmes	17
	v) Efficience du projet (ressources, activité, produit)	17
V.	Analyse des risques.....	17
VII.	Enseignements tirés.....	18
VIII.	Conclusions et Recommandations.....	19
IX.	Perspectives.....	19
XI.	Annexes	20
	Annexe 1 : Réalisation des activités	20
	Annexe 2 : Réalisation des produits.....	24
	Annexe 3 : Recommandations : PQA, SESP, COPIL, audit et autre du projet	28
	Annexe 4 : Le rapport financier CDR du projet disponible à la date de la revue ;.....	28
	Annexe 5 : Situation Quantum Transparency Dashboard	32

I. Sommaire

Débuté en août 2024, le Projet PONASI est au 31 décembre 2025 à cinq mois de mise en œuvre effective avec un taux physique de réalisation de 62,16% et 64,37% de réalisation financière du PTBA 2024 (cela prend en compte le montant des acquisitions en cours au niveau du PNUD, les lignes budgétaires y afférentes ont été entièrement considérées). Il s'est agi en ce début du projet des activités de concertation, de planification, de sensibilisation et prise de contact avec les communautés locales, de lutte anti braconnage et de lancement du processus de réalisations de diverses études. Malgré le retard de démarrage du projet et d'autres difficultés d'autres administratives (retard dans la prise des arrêtés de création du projet, de mise en place du comité de pilotage et la création du compte du projet dans la banque de dépôt du Trésor), la mise en œuvre du PTBA 2024 laisse entrevoir des bonnes perspectives. L'esprit d'anticipation et de participation des parties prenantes est un bon levier pour la réalisation des activités du projet.

II. Introduction.

Le Projet de Gestion Intégrée et Durable du Paysage de l'Aire Protégée du Complexe Pô-Nazinga-Sissili (PONASI) est le fruit d'un partenariat entre le Gouvernement du Burkina Faso, le Fond Mondial pour l'Environnement (FEM) et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD)

L'objectif global du projet est de contribuer à sauvegarder l'habitat essentiel de la faune, la biodiversité et les services écosystémiques dans le complexe de l'aire protégée PONASI par une gestion intégrée du paysage, générant des avantages multiples pour le développement durable dans le centre-sud du Burkina Faso. De façon plus spécifique, le projet vise à : (i) renforcer le cadre de gestion intégrée du paysage du PONASI, (ii) renforcer le système d'aires protégées du PONASI, (iii) renforcer la gestion durable des terres et des ressources et diversifier les moyens de subsistance et (iv) intégrer le genre et gérer les connaissances et les apprentissages.

Le projet couvre trois (3) régions (Centre-Sud, Centre-Est et Centre-Ouest), six (6) provinces (Sissili, Ziro, Bazèga, Zoundwéogo, Nahouri et Boulgou) et neuf (9) communes (Biéha, Sapouy, Pô, Guiaro, Toécé, Doulougou, Nobéré, Zabré, Zoaga).

L'approche participative a été privilégiée dans la mise en œuvre du projet tout en appliquant huit (8) principes à savoir : (i) équité et de solidarité sociale ; (ii) équité homme-femme ; (iii) prévention, (iv) précaution, (v) information et participation du public ; (vi) partenariat ; (vii) redevabilité ; (viii) subsidiarité).

Pour l'année de 2024, les principales activités ont concerné la réalisation des études de référence, l'évaluation du mécanisme de co-gouvernance, la sensibilisation des populations, la lutte contre le braconnage, l'entretien des pistes des aires protégées, le renforcement des capacités matérielles de l'équipe du projet surtout des partenaires de mise en œuvre, la conduite des études environnementales et l'intégration de l'approche genre dans les activités.

III. Contexte de mise en œuvre du projet

La zone d'intervention du projet PONASI fait partie des zones où le contexte sécuritaire s'est nettement amélioré. Au cours de l'année, aucun incident sécuritaire majeur de nature terroriste n'a été enregistré dans la zone d'intervention du projet. Cependant, les pressions anthropiques sont récurrentes dans les aires protégées notamment des velléités de braconnage sont présentes dans le complexe PONASI qui regorge d'un potentiel faunique. Au cours de l'année 2024, onze (11) cas de braconnage ont été enregistrés dans la Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga. Entre 2023 et 2024, on comptabilise de cinq (05) cas d'abattage d'éléphants dans le complexe notamment dans le Parc National de Pô / Kakoré Tambi (PNKT) et la Forêt Classée et Ranch de Gibier de Nazinga.




Photo 2 : Carcasse d'un éléphant abattu à ZOAGA dans le PNKT en mai 2024, prise de vue DPE/ Nahouri
GPS UTM (30P X 760757, Y 1213301

Au regard de ce contexte, des plaidoiries en faveur des activités de lutte anti braconnage ont été menées auprès des PNUD. Ce qui a permis de réorienter les activités du projet en prenant en compte la nouvelle donne afin d'assurer la conservation de la biodiversité et de sécuriser la quiétude de la faune et des populations locales.

IV. Performance du projet sur la période couverte par le rapport

i.) Efficacité dans la réalisation des activités

A la date du 31 Décembre 2024, le taux d'achèvement physique des activités du PTA est de 62,16%

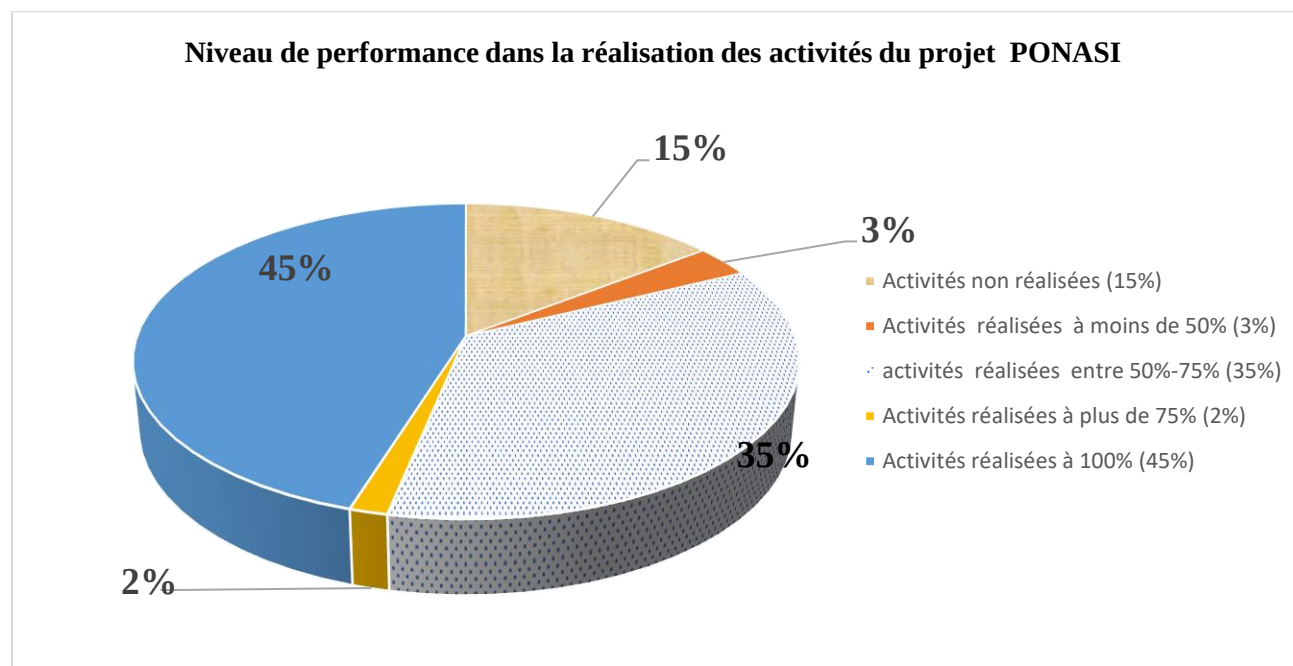

Au cours de l’année 2024, 82,26% des activités sont réalisées plus 50% dont 45% sont réalisées à 100%. Ce résultat est le fruit de cinq mois de travail de l’équipe de projet et des parties prenantes. Les activités non exécutées ou exécutées à moins de 50% s’expliquent par le retard de mise en place de l’équipe du projet, du fait de la volonté de produire plus de résultats par la réorientation de certaines activités pour prendre en compte la lutte anti braconnage, une condition indispensable pour l’atteinte des résultats attendus du projet. Ces activités non réalisées se justifient par le fait que leur mise en œuvre est conditionnée par la réalisation d’autres activités qui n’ont pas été achevées au cours de l’année 2024. Aussi, l’équipe du projet a pris diverses initiatives pour anticiper la mise en œuvre de certaines activités de façon simultanée en parfaite collaboration avec les parties prenantes du projet dont les acteurs de gestion des entités des trois aires protégées du complexe PONASI.

ii) Efficacité dans la réalisation des produits « Key Results »

Produit 1.1 : Mise à jour, renforcement et opérationnalisation du cadre de Co gouvernance du paysage PONASI pour assurer une gestion concertée, intégrée et équitable de l'utilisation des terres et des ressources dans le paysage de 952 000 ha et pour maximiser les avantages environnementaux et socio-économiques

Indicateurs de produit	Baseline		2024		Situation cumulée	
	Valeur	Année	Cible	Actuals	Cible Fin de projet	Situation à date
Ind 1.1 : Superficie du paysage de PONASI gérée efficacement conformément au plan directeur de gestion du paysage.	0ha	2024	354 781	O	952 000	0

Dans ce produit, quatre-vingt (84) acteurs locaux composés des membres des zones villageoises d’intérêt cynégétique (ZOVIC), des associations et ONG locales, des collectivités territoriales, des services techniques de l’Etat et des projets et programmes de la zone intervention du Projet PONASI sont disposées à accompagner le projet dans sa mise en œuvre pour une gestion efficace et efficiente des trois aires protégées du complexe PONASI.

Également, le projet a participé à l’organisation de cadre de concertation provinciale du Nahouri qui a connu la participation de quatre-vingt-trois (83) membres des collectivités territoriales, des services techniques déconcentrés de l’Etat, des organisations de la société civile, des projets et programmes, d’Associations et des ONG. La vision du projet, les activités, sa stratégie d’intervention sont désormais connus des membres du Cadre de Concertation Provincial du Nahouri qui abrite le siège du projet. Les membres se sont engagés à contribuer à la bonne mise en œuvre du projet.



Photo 3 : Echanges sur l’approche et les axes d’intervention du projet PONASI avec les acteurs locaux, prise de vue le 02/11/2024 par A W NIKIEMA



Photo 4: Photo de famille de membres du CCP 03/12/2024 à Pô

Aussi, le projet a contribué à l'organisation de la visite du Ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement dans le complexe PONASI qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion de la gestion durable de la faune et gouvernance des aires protégées de cet espace PONASI. Cette visite a été organisée dans le cadre du semestre de la faune initiée par la Direction Générale des Eaux et Forêts avec l'accompagnement du Projet PONASI. . Cette activité a connu la participation de plus de quatre-dix (90) personnes



Photo 5 : Photo de famille de la visite du MEEA au FC/RG Nazinga ; décembre 2024



Photo 6 : Visite de barrage de Kaliéboulou réhabilité par la Direction Régionale en charge de l'eau ; 7 décembre 2024

En lien avec cette même activité, des panneaux de signalisation ont été réalisés en vue du renforcement la visibilité du complexe PONASI notamment dans le PNKT et le Ranch de gibier de Nazinga et du Projet PONASI. Il s'agit de l'implantation de deux (2) panneaux de signalisation réhabilités au niveau du PNKT, de 03 panneaux de signalisation réhabilités au niveau de FCRGN et la réhabilitation du portique du FCRGN



: Photo7 : Panneau de signalisation du PNKT dévoilé le 06/12/2024

Cette sortie de la délégation ministérielle conduite par le Chargé de Mission a fait l'objet de communication dans les médias Burkina Faso. Il s'agit entre autres :

- du Système d'Information du Gouvernement
- (<https://www.youtube.com/watch?v=4UlljnKhJaI>;

<https://www.facebook.com/sigbf226/videos/1322900045537394/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>) ;

- de la télévision Nationale (<https://www.facebook.com/share/1B4dkVrVpi/>) et
- d'autres médias (<https://lefaso.net/spip.php?article134772>)

Produit 2.1 : la Capacité institutionnelle des agences de gestion des aires protégées (OFINAP et DGEF) et des 3 Directions régionales en charge des Aires Protégées concernées est accrue

Indicateurs de produit		Baseline		2024		Situation cumulée	
		Valeur	Année	Cible	Actuals	Cible Fin de projet	Situation 31/12/2025
Changement de la capacité institutionnelle des agences de gestion des aires protégées, tel que mesuré par le tableau de bord du développement des capacités du PNUD pour les projets du FEM	Ind 2.1.1 Capacités d'engagement	67%	2018	N.D	N.D	89%	N.D
	Ind 2.1.2 Capacités de production, d'accès et d'utilisation des informations et des Connaissances	40%	2018	N.D	N.D	80%	N.D
	Ind 2.1.3 Capacités d'élaboration de stratégies, de politiques et de législations	56%	2018	N.D	N.D	67%	N.D
	Ind 2.1.4 Capacités de gestion et de mise en œuvre	50%	2018	N.D	N.D	67%	N.D
	Ind 2.1.5 Capacités de suivi et d'évaluation	17%	2018	N.D	N.D	67%	N.D

En ce début de mise en œuvre du projet, des échanges avec la DGEF et l'OFINAP ont permis de mieux expliquer les activités et surtout de recueillir leur attente. Des activités urgentes de renforcement de leur capacité opérationnelle sont identifiées à savoir l'imminence de la lutte anti braconnage (LAB), de l'entretien des pistes périmétrales et internes et l'application des feux d'aménagement ou feux précoces dans les Aires protégées.



Photo 8 : Echanges avec le Directeur Général des Eaux et Forêts et son staff sur certaines activités urgentes à réaliser avec l'appui du Projet PONASI, prise de vue le 25/10/2024 par A W NIKIEMA

Ces échanges ont permis de planifier et d'exécuter les activités de lutte anti braconnage et des activités d'aménagement de l'habitat de la faune. En ce qui concerne la lutte anti braconnage, les opérations ont consisté d'abord à faire des ratissages impliquant 65 agents forestiers, 30 auxiliaires (Ecogardes, Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de l'UG-RGN, surveillants villageois). Des agents de six (06) Directions Provinciales des Eaux et Forêts des trois régions (Centre Est, Centre Ouest et Centre Sud). Ce qui permis de sécuriser le tronçon Nobéré-Katchéli sur la Route nationale (RN 5) traversant le Parc National KABORE Tambi., de sécuriser les postes de Oualème, Kaliéboulou, Barka et le campement d'Akwazena. Le ratissage a couvert principalement le PNKT et la FCRGN. Des équipes de patrouilles ont été déployées à cet effet.

Le ratissage est suivi d'opération de lutte anti braconnage qui a mobilisé 68 agents forestiers, 32 écogardes mobilisés, 53 VDP et surveillants villageois ; Ce qui a permis d'appréhender deux (02) prévenus dans la FC Sissili pour carbonisation et braconnage, de dresser 01 Procès-verbal, d'observer des indices de braconnage (piste de braconnier, empruntes humaines, trace de vélo, ...), de détruire deux (02) affûts de braconnage et d'identifier un (01) campement de pêche illégale. Cette activité a produit les effets suivants :

- 2 601 hommes jours de patrouille réalisés ;
- Une diminution des actes de flagrants délits de braconnage dans la FCRGN et la FCZCS ;
- Plus de 55% de participation communautaires aux actions de protection et de sécurisation des aires protégées ;
- La création d'emploi et source de revenus pour les communautés riveraines,
- La collecte de données sur le suivi écologique et les aménagements hydrauliques ;
- l'application des feux d'aménagement ;
- Lors des opérations de patrouille, un élève malade et égaré dans le ranch a été secouru.





Photo9 : Images des activités de la LAB , Décembre 2024

Produit 2 .2 : l'efficacité de la gestion des aires protégées est améliorée

Indicateurs de produit	Baseline		2024		Situation cumulée	
	Valeur	Année	Cible	Actuals	Cible Fin de projet	Situation à date
Ind 2.2.1 a : Superficie des aires protégées terrestres dont l'efficacité de gestion a été améliorée, comme en témoigne l'évolution des scores METT des aires protégées existantes par rapport aux valeurs de référence suivantes : PNKT (39), Sissili (47), Nazinga (75), corridor # 1 (31), ZOVIC Biéha (36) et ZOVIC Guiaro et Po (55) (Indicateur de base 1.2 de FEM-7)	0	2024	91 300	ND	321 781	ND
Ind 2.2 .1. b : Superficie de l'aire protégée nouvellement créée (Corridor # 2) (Indicateur de base 1.1 de FEM-7)	0	2024	0	0	33 000	0
Ind 2.2.2 Nombre annuel de cas de conflits homme-faune dans les points chauds (identifiés la première année par l'évaluation rapide des systèmes SAFE), notamment les villages de Mantoingo, Zerboko, Yougoudri, Saro, Sia, Natiédougou, Boissa et Boala.	ND	2024	-30%	ND	-70%	ND
Ind 2.2.3 Nombre annuel moyen d'indications (preuves) directes et indirectes d'activités illicites enregistrées par sortie de patrouille, y compris les carcasses, les pièges, les rencontres visuelles et les arrestations de braconniers.	ND	2024	-20%	ND	-50%	ND
Ind 2.2.4 État des ressources dans les aires protégées, y compris les aires protégées par l'État, a) Abondance relative des mammifères de grande et moyenne taille, notamment le Bushbuck Tragelaphus	ND	2024	-0%	ND	-0%	ND

ZOVIC et les corridors.	scriptus et le Bohor Reedbuck Redunca redunca ;						
	b) Abondance relative du petit gibier, y compris les tourterelles (diverses espèces), la pintade (Numida meleagris) et le francolin (Francolinus bicalcaratus)	ND	2024	-0%	ND	-0%	ND
	c) Niveau d'invasion des AP par le bétail domestique	ND	2024	-20%	ND	-50%	ND

Diverses activités dont des études sont en cours qui permettront de déterminer les situations de références et de renseigner les indicateurs du projet ; d'autres comme les sensibilisations, l'amélioration de mobilité des équipes des surveillance sont réalisées.

En ce qui concerne la mobilité des équipes de surveillance, le réseau de pistes du Complexe PONASI a été entretenu en utilisant la main d'œuvre et l'expertise locales. Cette activité a consisté en l'ouverture des pistes et au traitement des ravins. Ainsi donc, 245 km de pistes ont été entretenues impliquant deux cent trente (230) membres des communautés locales dont 35 % de femmes. Il s'est agi principalement de (i) débroussailler et dégager la végétation herbacée et des repousses de ligneux sur les pistes, (ii) dévégétaliser les digues des barrages, (iii) combler des ravins et autres crevasses causés par les ruissellements des eaux, (iv) empierrer des passages difficiles des zones de bas-fond, (v) gabionner les ravins.



Photo 10: ouverture des pistes Décembre 2024



Photo 11: Traitement des ravins Décembre 2024



Photo 12 : Participation active des femmes à l'entretien des pistes

Pour le Commandant des Eaux et forêts, TIENDREBEOGO B. S. F. Kevin, Directeur de l'Unité de Gestion du Ranch de Nazinga, cette activité a permis d'améliorer la mobilité des équipes de surveillance, de tourisme et de suivi écologique dans la FCRGN et de restaurer la quiétude et la cohésion entre le personnel forestier et les communautés riveraines ».



Photo 13 : Remise de matériels et équipements pour l'entretien des pistes et le traitement des ravins

Pour ce qui est de la sensibilisation des populations locales, le projet a conduit des sorties terrain qui a permis de tenir vingt-six (26) réunions communautaires et touché 1 447 personnes avec plus 24% de femmes dans 26 villages de 14 quatorze communes et 6 provinces des trois régions. Tous les participants connaissent désormais le Projet PONASI, ce qui facilitera sa mise en œuvre. Les séances de sensibilisation ont porté sur l'importance de la biodiversité, l'engagement et la participation des communautés à la préservation des écosystèmes. Les communautés connaissent l'importance de la biodiversité.



Photo 14 : Témoignage de la Présidente de la coopérative ZEMSTAABA de Toécé sur l'importance et l'engagement des femmes dans la protection et la conservation de la biodiversité

Lien de l'interview : <https://fb.watch/xzkk8MYNHc/>

Pour Patounsidi MORGO, Présidente de la coopérative ZEMSTAABA de Toécé « les femmes profitent des bienfaits de la nature » et C’est pourquoi renchérit-elle « nos larmes coulent en voyant un arbre de karité mourir ».

Ces sorties terrain ont été l’occasion d’identifier 332 leaders communautaires dont 23 % de femmes venus de 95 villages riverains du complexe PONASI. Ces rencontres ont été présidées par les Présidents des Délégations Spéciales et sanctionné par la signature d’un procès-verbal. Deux équipes du projet ont conduit cette activité qui a permis d’échange avec les leaders sur leurs rôles et leurs responsabilités dans la mise en œuvre du projet. Ainsi Monsieur NEBIE Alassane, Chef de village de Bori, commune de Biéha déclare « Si tu connais mieux un étranger (projet), tu sauras mieux l’accompagner » et affiche des attentes en disant « des projets sont achevés et on n’a rien vu ».



Photo 15 : séance de sensibilisation à Rakaye dans la commune de Doulougou



Photo16 : Séance de sensibilisation à Torem commune de Pô, 11 Décembre 2024



Photo 17 : Identification des leaders communautaires dans la commune de Nobéré



Photo 18 : Identification des leaders communautaires dans la commune de Guiaro

Produit 3.1 : une gestion intégrée agro-sylvo-pastorale efficace des ressources naturelles et agricoles, et d'une agriculture intelligente face au climat par les communautés locales au sein du paysage PONASI est adoptée ;

Indicateurs de produit				Baseline		2024		Situation cumulée	
				Valeur	Année	Cible	Actuals	Cible Fin de projet	Situation à date
Ind 3.1 .1	Superficie des terres faisant l'objet	a)	superficie des terres agro-pastorales aménagées	0	2024	1 500 ha	ND	4 500	ND

pratiques de gestion agro-sylvo-pastorales améliorées et d'une agriculture intelligente face au climat), y compris	(superficie totale : 6000 ha dans les sites pilotes)						
	b) les forêts communales et villageoises et les massifs forestiers (superficie totale : 39 783 ha)	0	2024	9 946 ha	ND	29 837	ND
	c) les zones de pâturage soumises à des outils de gestion consensuels (superficie totale : 52 886 ha)	0	2024	13 221 ha	ND	39 664	ND
	d) les Chantiers d'Aménagement Forestier dont le modèle est évalué, révisé et mis en œuvre (superficie totale : 73 969 ha)	0	2024	18 492 ha	ND	55 477 a	ND

La réalisation de la situation de référence est la seule activité prévue en 2024 (dans la composante 3 regroupant les produits 3.1 et 3.2) et est cours de réalisation. Ce commentaire est valable pour le produit ci-dessous.

Produit 3.2: Moyens de subsistance des communautés locales sont diversifiés à travers le développement du tourisme et aux filières basées sur les produits forestiers ;

Indicateurs de produit		Baseline		2024		Situation cumulée	
		Valeur	Année	Cible	Actuals	Cible Fin de projet	Situation à date
Ind 3.2.1: Revenu individuel annuel moyen dans les communautés locales et nombre de bénéficiaires directs (ventilés par genre) de l'emploi dans les filières des	a. du tourisme lié aux aires protégées	ND	2024	-	ND	+30%	ND
	b. des filières du karité, de la liane goïne et du miel	ND	2024	-	ND	Karité +20% Liane+50% Miel+20%	ND

PFNL et du tourisme							
Ind 3.2.2 État des ressources	a. Zones forestières, y compris les zones de gestion forestière (CAF), les communes et les forêts villageoises	ND	2024	-	ND	Maintien ou amélioration	ND
	b. Zones de pâturage	ND	2024	-	ND	Maintien ou amélioration	ND

Produit 4.1: les opportunités pour les femmes de bénéficier de la gestion durable des ressources naturelles et des filières liées aux aires protégées dans le paysage PONASI ont augmenté

Indicateurs de produit	Baseline		2024		Situation cumulée	
	Valeur	Année	Cible	Actuals	Cible Fin de projet	Situation à date
Ind 4.1 : Représentativité des femmes dans le dispositif de gouvernance collaborative et de participation à la prise de décision sur l'utilisation des terres et des ressources.	ND	2024	30%	ND	30%	ND

Au cours de l'année 2024, le projet a tenu son premier comité de pilotage à Manga le 27 décembre 2024. Ainsi, le Projet PONASI a été présenté aux membres ainsi que le bilan des activités réalisées. Après examen du PTBA 2025, le comité l'a validé et formulé trois recommandations. Il s'agit de :

1. Travailler en synergie avec les acteurs intervenant dans la zone du projet ;
2. Etablir des conventions de collaboration avec des structures étatiques pour la mise en œuvre des activités qui relèvent de leurs missions régaliennes.
3. Engager des démarches nécessaires pour mobiliser la contrepartie financière de l'état au profit du projet.



Photo 19: Atelier de planification du PTBA 2025 à Pô, Octobre 2024



Photo 20: Session du comité de Pilotage tenu à Manga, Décembre 2024

Produit 4.2: les connaissances développées dans le projet PONASI par les différents acteurs du paysage PONASI et du Burkina Faso sont appropriées

Indicateurs de produit	Baseline		2024		Situation cumulée	
	Valeur	Année	Cible	Actuals	Cible Fin de projet	Situation à date
Ind 4.2 : Proportion de groupes / associations villageois qui appliquent les connaissances partagées dans le cadre du projet, en dehors des sites d'intervention pilotes.	0%	2024	20%	ND	80%	ND

L'élaboration d'un mécanisme de gestion des plaintes, en plus du plan d'action genre, est en cours et permettra d'améliorer la prise en compte de la représentation des femmes dans la gouvernance du complexe PONASI et la proportion des associations qui appliquent les connaissances partagées et de limiter la discrimination faite aux femmes et aux jeunes.

Les activités de sensibilisation tenues dans les différentes communes au cours de mois de décembre ont été une belle opportunité d'aborder la question du genre et de la participation de la femme.

iii) Changements obtenus au niveau Effet : analyse des indicateurs CPD et IRRF

En cinq mois de mise en œuvre du projet en cette première année, les effets attendus ne sont encore mesurables. Les changements espérés sont toujours à attendre. Toutefois, les dernières activités de l'année 2024 (LAB, sensibilisations) ont permis une légère amélioration des indicateurs.

Indicateur CPD/IRRF		Contribution du projet	Evidences (histoires de vie, témoignages...)	Commentaire
Les ressources naturelles qui sont gérées dans le cadre d'un régime d'utilisation durable, de conservation, d'accès et de partage des avantages :	a) Superficie des habitats terrestres sous (nouvelle) protection (hectares) (réf. indicateur 8b)	ND		
	b) Superficie de l'aire protégée existante sous gestion améliorée (hectares) (indicateur de référence 8a)	ND		
	c) Superficie sous gestion forestière durable (hectares)	ND		
	d) Superficie des terres consacrées aux pratiques durables de gestion pastorale ou d'agriculture intelligente face au climat dans les sites pilotes.	ND		
Nombre de bénéficiaires directs du projet (hommes et femmes agriculteurs, travailleurs forestiers et agricoles / éleveurs, hommes et femmes dans les filières et les activités		200 personnes	Pour le directeur du Ranch de Nazinga cette	L'entretien des pistes réalisées en HIM0 avec la participation

touristiques), bénéficiant de moyens de subsistance créés ou améliorés en relation avec la gestion durable des ressources naturelles et des services écosystémiques dans le paysage PONASI, ventilé par genre. (Indicateur de base 11 FEM-7)		activité permet « un accroissement des revenus de la population, un des objectifs clés de la création du ranch de Nazinga »	de 200 personnes y compris des PDI dont 80 femmes pour un coût de
Tendance statistiquement significative de la taille de la population d'éléphants dans le paysage PONASI	ND		
Émissions de GES évitées par une gestion intégrée du paysage en réduisant le taux de déforestation dans les paysages forestiers et en restaurant les habitats naturels (Indicateur de base 6 du FEM-7 - Réduction des émissions de gaz à effet de serre (tonnes métriques d'équivalent dioxyde de carbone)	ND		

iv) Résultats et impacts dans le cadre de l'égalité des sexes et autonomisation des femmes

Les activités de terrain ont permis de mieux prendre en compte l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Un mécanisme de gestion des plaintes est élaboré et le plan d'action genre en cours de révision. Ce qui permettra de donner les chances au projet d'atteindre sa cible en matière de genre

v) Efficience du projet (ressources, activité, produit)

CE = 62,16 /64,37 soit CE = 0,97

Théoriquement :

- Si CE <=1 : projet peu efficace
- Si CE >1 : projet efficace

V. Analyse des risques

Risques	Activités de mitigation 2024	Situation de mise en œuvre des activités de mitigation à jour	Observations sur le risque
Non adhésion totale des acteurs	Multiplier les rencontres et les cadres de concertations avec les acteurs et les parties prenantes du projets et tous acteurs intervenant dans le PONASI	- Un atelier de démarrage et de présentation du PONASI a été organisé qui a connu la participation de quatre-vingt acteurs du PONASI - Appui à l'organisation du cadre de concertation provincial de Nahouri en cours - Séance de travail avec le DGEF et l'OFINAP sur la mise en œuvre des activités 2024 et	Fortes attentes des acteurs du Projet PONASI Non prise en compte de certaines attentes des communautés

		les perspectives de l'année 2025	
Dégradation éventuelle de la situation sécuritaire dans les zones d'intervention du Projet avec des accès difficiles aux populations pour mener les activités	- Renforcer l'utilisation des technologies de l'information pour le staff du projet (e-travail) ; - Accentuer la surveillance des AP - Recourir à des prestataires locaux qualifiés (ONG et Associations locales) pour la mise en œuvre de certaines activités ;	Opération de surveillance et de lutte anti braconnage en cours d'élaboration	Non-respect des consignes sécuritaires par les communautés Faible collaboration avec les agents des Eaux et forêts et les écogardes
Indisponibilité du matériel de travail dû à la lenteur dans les acquisitions	Lancer toutes les commandes d'acquisition dès la validation du PTBA	Procédure d'acquisition par le PNUD engagé en juillet 2024	Matériels non encore livrés
Retard dans la mise à disposition des fonds	Diligenter les demandes de fonds	Procédure de demande de fonds entamée au PNUD dès la création du compte du Projet au Trésor publique	Du fait de la lourdeur des procédures administratives,
Retard dans la mise en place de l'équipe du projet	Prendre des actes pour encadrer la mise en œuvre du projet par les autorités	L'équipe du projet a été mis en place le 1 ^{er} Août 2024	Possibilité d'instabilité du personnel

Nouveaux risques :

- Défaillance des prestations intellectuelles

VI. Contraintes et difficultés rencontrées

La principale difficulté de mise en œuvre des activités de l'année 2024 est le retard de démarrage effectif du projet. Mise en place le 1^{er} Août 2024, l'équipe du projet s'est attelé malgré tout à une bonne exécution du PTBA 2024.

Le projet a connu au cours de l'année 2024 des difficultés d'ordre administratif liées à sa création officielle et à la mise en place du comité de pilotage intervenues respectivement trois mois et cinq mois après le démarrage effectif du projet.

Installée en Août 2024, l'équipe du projet ne dispose toujours pas de certains moyens matériels de travail en dépit des procédures d'acquisition de matériels engagés en Juillet- Août 2024, la livraison n'est pas encore effective.

VII. Enseignements tirés

Les enseignements tirés de la mise en œuvre des activités du projet sont en outre :

- ⇒ L'anticipation dans la mise en œuvre des activités : elle a permis de mener des activités (atelier de présentation du projet, le lancement des appels à candidatures de consultant pour la réalisation des diverses études, élaboration du PTBA 2025)

- ⇒ Le principe de participation des parties prenantes du projet : l'équipe du projet a rencontré les principaux acteurs de mise en œuvre du projet dont la DGEF, l'OFINAP, les acteurs du PONASI-UE. Cela a permis de réorienter les priorités du moment en prenant en compte la lutte anti braconnage et d'intégrer d'autres activités importantes dans le PTBA 2025 comme les inventaires de faune et les appuis en kits de production. Ce qui a aussi permis de tirer des leçons de la mise en œuvre des précédents projets dans le PONASI
- ⇒ La responsabilisation et l'implication active des partenaires de mise en œuvre comme la DGEF et l'OFINAP a permis d'exécuter des activités à l'intérieure des aires protégées.

VIII. Conclusions et Recommandations

Au regard des difficultés et des leçons tirées dans la mise en œuvre des activités, il apparaît nécessaire :

- ⇒ Poursuivre la mise en œuvre du projet avec un esprit d'anticipation ;
- ⇒ Prendre des mesures pour garantir l'implication effective et à temps des parties prenantes en particulier les bénéficiaires ;
- ⇒ Prendre des mesures idoines pour la participation effective des femmes et des jeunes dans les activités du projet.

IX. Perspectives

L'année 2025 devrait permettre de finaliser et de valider les diverses études entamées et de conduire d'autres études afin que le complexe PONASI dispose des documents et outils nécessaires pour une conservation pérenne de la biodiversité et des services écosystémiques. Il s'agira aussi de mettre un point d'honneur à la lutte anti braconnage et aux activités de gestion durable des terres afin réduire les pressions diverses sur les ressources. L'ensemble des activités prendront leur racine dans la prise en compte de la femme et des jeunes des communautés riveraines du complexe PONASI.

X. Situation financière

Pour la mise en œuvre du PTBA 2024, le budget prévisionnel était de **703 208 \$** dont **48 000 \$** du PNUD et **655 208 \$** du FEM. Le Taux d'exécution financière est de **64,37%**. Le taux financier par bailleur est de **100%** pour le fond PNUD et **61,76%** pour les Fonds FEM (Cf. annexe 4). Par composante, le taux financier est de :

- **17,85%** pour la composante 1 ;
- **87,51%** pour la composante 2 ;
- **67,47%** pour la composante 3 ;
- **36,09%** pour la composante 4 ;
- **1,64%** pour la composante gestion du projet.

XI. Annexes

Annexe 1 : Réalisation des activités

Tâches	Taux activités	Résultats atteints
Activité 1.1.1.1 : évaluer le mécanisme de co-gouvernance établi par NATURAMA dans le cadre d'un projet précédent (PONASI)	55	Attribution du marché, négociation
Activité 1.1.1.2. Organiser un atelier de validation du rapport d'évaluation du mécanisme de co-gouvernance	0	Non réalisé
Activité 1.1. 1.3. Accompagner la redynamisation et l'opérationnalisation du dispositif de Co-gouvernance du paysage PONASI comme plateforme intégrée de prise de décisions conjointes entre la DGEF, l'OFINAP, la DRE, la DREP, les représentants des communautés et des opérateurs privés	100	84 personnes (Administration : 4, collectivités territoriales : 9, services techniques de l'Etat : 30, OSC/ ONG : 17, Autorités coutumières : 4, projets et programmes : 20)
Activité 1.1.1.4. Collecte d'informations et de données pour soutenir l'évaluation du mécanisme de Co gouvernance et la conception du système d'information environnementale	55	Attribution du marché, négociation
Activité 1.1.2.1 : appuyer l'organisation les réunions annuelles du mécanisme de co-gouvernance dans le cadre du processus de planification	100	Contribution à l'organisation du semestre de la faune, 98 participants
Activité 1.1.2.2 : organiser des rencontres trimestrielles du noyau technique permanent pour suivre le processus de planification	100	Organisation d'un atelier de planification à Pô, le PTBA 2025 à soumettre au COPIL élaboré
Activité 1.1.2.3 : Assurer le suivi périodique et le soutien technique des activités de la composante 1 par le personnel du PNUD	100	Accompagnement à la mise en œuvre du projet
Activité 1.1.3.1. Élaborer un plan de formation des acteurs impliqués dans la gestion du paysage PONASI	55	Attribution du marché, négociation
Activité 1.2.2.2: réaliser une évaluation de Consentement libre, préalable et éclairé	55	Attribution du marché, négociation
Activité 1.3.1.1. Réaliser la situation de référence du niveau de carbone dans le complexe du PONASI ;	55	Attribution du marché, négociation
Activité 1.4.1.1. Élaborer le Plan Directeur de gestion du paysage PONASI pour guider la gestion du paysage du PONASI au cours des 15 prochaines années	55	Attribution du marché, négociation
Salaire équipe du projet	100	Le salaire du personnel payé
Achat de carburant et l'entretien des véhicules de l'unité de coordination du projet qui seront utilisés pour la plupart des missions sur le terrain	100	L'entretien du véhicule servant à l'UCP est réalisé
Activité 2.1.1.1 : Accompagner la mise en place d'un arrangement institutionnel optimal pour la gestion des AP du complexe	58	Attribution du marché, négociation

Activité 2.1.1.2 : Tenir 01 session des cadres de concertation	100	Organisation du CCP du Nahouri; 83 participants
Activité 2.1.1.3 : Contribuer à l'organisation des sessions du forum du cadre de concertation du complexe PONASI	100	Accompagnement à l'organisation semestre de la faune
Activité2.1.2.1 : Renforcer l'opérationnalisation du bureau SIG	53	Contrat signé
Activité2.2.1.2 : Réviser la limite sud du Ranch de gibier du Nazinga (le long de la frontière ghanéenne), pour inclure l'espace intermédiaire non protégé dans l'aire protégée,	0	non réalisé
Activité2.2.1.3 : Sensibiliser les populations locales riveraines de la forêt classée de la Sissili sur le statut réel de la forêt classée et sur les usages autorisés tels que définis dans l'arrêté de classement.	40	TDR validé
Activité2.2.1.4 : Sensibiliser les populations locales riveraines des forêts classées du PONASI autres que la Sissili sur les usages autorisés tels que définis dans l'arrêté de classement.	40	TDR validé
Activité2.2.1.7 : . Entretenir les pistes périmétrales pour qu'elles servent également de pare-feu.	100	200 km de pistes entretenues ; 230 personnes dont 80 femmes ont participé aux travaux
Activité2.2.3.1 : Tenir des réunions avec les communautés riveraines des aires protégées, y compris les corridors, afin de les sensibiliser à l'importance de la biodiversité, de promouvoir leur engagement dans le processus de gestion collaborative,	100	Vingt-six réunions tenues, 1 447 personnes touchées avec plus 24% de femmes dans 26 villages de 14 quatorze communes et 06 provinces des régions Centre Sud, Centre Est et Centre Ouest
Activité2.2.3.2 : Identifier des membres des communautés locales qui seront chargés des négociations des accords de gestion collaborative avec l'appui d'agents de mobilisation communautaire ;	100	332 leaders communautaires dont 23 % de femmes de 95 villages riverains du complexe PONASI ont participé aux échanges avec le projet sur leurs rôles et leurs responsabilités dans la mise en œuvre du projet
Activité 2.2.4.1. Définir des indicateurs pour le suivi à long terme de la biodiversité et des services écosystémiques pour chacune des AP et pour le complexe d'AP dans son ensemble.	58	Attribution du marché, négociation
Activité2.2.4.2 : Elaborer un plan de surveillance des AP pour suivre de près les principales ressources sensibles / vulnérables de chaque AP,	55	Attribution du marché, négociation
Activité 2.2.5.1. Sensibiliser et informer les communautés locales sur les effets néfastes du braconnage au niveau local, pour le pays en termes d'opportunités perdues, et pour la biodiversité, et sur les risques encourus par les contrevenants locaux en termes de sanctions pour leurs délits ;	100	

Activité 2.2.5.4. Informer et rappeler le zonage des AP et des corridors et les règles qui leur sont applicables aux membres des communautés locales (Ecogardes).	100	
Activité 2.2.5.5. Former les écogardes et les forestiers sur le logiciel SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool) pour mieux suivre, évaluer et gérer de manière adaptative les activités de patrouille.	100	La lab est réalisé : -68 agents forestiers mobilisés ; 32 écogardes mobilisés ; -53 VDP et surveillants villageois mobilisés ; -2 601 hommes jours de patrouille réalisés ; -02 prévenus appréhendés dans la FC Sissili pour carbonisation et braconnage ; -01 Procès-verbal dressé ; -Des indices de braconnage observés (piste de braconnier, emprunts humaines, trace de vélo, ...) ; -02 affûts de braconnage détruits ; -01 campement de pêche illégale identifié.)
Activité 2.2.5.6. Equiper les écogardes et les forestiers pour la surveillance des AP	53	Contrat signé
Activité 2.4.1.5: Etablir les valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 2	55	Attribution du marché, négociation
Loyer+ équipements (réserve pour la contribution)	0	Non réalisé
Achat de véhicule 4*4 pour le PNKT et maintenance	53	Contrat signé
Achat d'un véhicule 4*4 pour l'UGP	53	Contrat signé
Achat de motos (8)	53	Contrat signé
Salaire de l'équipe du projet	100	Le salaire du personnel payé
Suivi du PNUD	100	Accompagnement à la mise en œuvre du projet
Activité 3.1.1.1 Etablir les valeurs de références pour les indicateurs de résultats de la composante 3	55	Attribution du marché, négociation
Salaire de l'équipe du projet	100	Le salaire du personnel payé
Suivi du PNUD	100	Accompagnement à la mise en œuvre du projet
Achat d'un véhicule 4*4 pour l'UGP	53	Contrat signé
Achat de motos (8)	53	Contrat signé
Activité 4.1.1.2 Superviser et surveiller l'intégration de la dimension de genre	80	La participation est femme est effective
Activité 4.2.1.1 : Assurer le suivi des activités du projet par l'UGP	100	Les activités du projet sont suivies
Activité 4.2.1.2 : Réaliser les EIES	55	Attribution du marché, négociation

Activité 4.2.1.7 : Suivi et évaluation des activités du projet par l'expert du projet de suivi et d'évaluation	100	Des missions effectuées
Activité 4.2.1.9 : Organiser des sessions du Comité de pilotage du projet	100	Une session tenue, le PTBA 2025 validé
Activité 4.3.1.1 : Réaliser des sensibilisations mass-médias sur les activités du projet	100	Des panneaux de signalisation des aires protégées confectionnés
Activité 4.3.1.2 : Elaborer et valider une stratégie de communication du projet et son plan d'action	55	Attribution du marché, négociation
Activité 4.3.1.3 : Concevoir un système de suivi évaluation pour le projet	0	Non réalisé
Activité 4.3.1.4 : élaborer un manuel de procédure du projet	0	Non réalisé
Activité 4.3.1.5 : Achat d'un véhicule 4x4 pour soutenir toutes les activités du projet (25% pour la composante)	53	Contrat signé
Activité 4.3.1.6 : Acquérir les accessoires liés à l'intégration de la dimension de genre, à la gestion des connaissances et à l'apprentissage, y compris les consultations publiques de l'EESS	0	Non réalisé
Activité 4.3.1.7 : Consultation des parties prenantes pour le suivi et l'évaluation du cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) et mise à jour	0	Non réalisé
Salaire de l'équipe du projet	100	Le salaire du personnel payé
Achat de carburant et l'entretien des véhicules de l'unité de coordination du projet qui seront utilisés pour la plupart des missions sur le terrain	100	Contrat signé
Salaire partiel équipe du projet	100	Le salaire du personnel payé
Location de locaux pour accueillir l'UCP à Po	0	Non réalisé
Mobilier de bureau comprenant 3 bureaux de travail, des tables, des chaises, des classeurs, des étagère	100	Contrat signé
Équipement informatique pour le bureau de l'UCP, y compris 1 ordinateur portable pour le coordinateur du projet	53	Contrat signé
Abonnement Internet pour le bureau de l'UCP	100	Des kits de connexion disponible
Fournitures de bureau.	100	Contrat signé
Accessoires de gestion du projet	0	
TAUX GLOBAL (%)	62,16	

Annexe 2 : Réalisation des produits

Produit	Indicateur	Valeur de référence (2024)	2024		Explication des écarts ou bonnes pratiques
			Cible	Situation	
Résultat 1 :	Cadre pour la gestion intégrée du paysage de PONASI avec un financement durable pour son fonctionnement				
Produit 1.1: Mise à jour, renforcement et opérationnalisation du cadre de Co gouvernance du paysage PONASI pour assurer une gestion concertée, intégrée et équitable de l'utilisation des terres et des ressources dans le paysage de 952 000 ha et pour maximiser les avantages environnementaux et socio-économiques	Ind 1.1 : Superficie du paysage de PONASI gérée efficacement conformément au plan directeur de gestion du paysage.	0	354781	0	Début de projet avec trois de mise en œuvre
Résultat 2 : Renforcement du système d'aires protégées PONASI					
Produit 2.1: Changement de la capacité institutionnelle des agences de gestion des aires protégées, tel que mesuré par le tableau de bord du développement des capacités du PNUD pour les projets du FEM :	Ind 2.1.1 Capacités d'engagement	67%	ND	ND	
	Ind 2.1.2 Capacités de production, d'accès et d'utilisation des informations et des Connaissances	40%	ND	ND	
	Ind 2.1.3 Capacités d'élaboration de stratégies, de politiques et de législations	56%	ND	ND	
	Ind 2.1.4 Capacités de gestion et de mise en œuvre	50%	ND	ND	
	Ind 2.1.5 Capacités de suivi et d'évaluation	17%	ND	ND	
2.2 Amélioration de l'efficacité de la gestion des aires protégées sur 54 781 ha, y compris les aires protégées de l'État, les aires protégées communautaires et les corridors	Ind 2.2.1.a : Superficie des aires protégées terrestres dont l'efficacité de gestion a été améliorée, comme en témoigne l'évolution des scores METT des aires protégées existantes par rapport aux valeurs de référence suivantes :	0	91 300	ND	

Produit	Indicateur	Valeur de référence (2024)	2024		Explication des écarts ou bonnes pratiques
			Cible	Situation	
fauniques au sein du complexe PONASI.	PNKT (39), Sissili (47), Nazinga (75), corridor # 1 (31), ZOVIC Biéha (36) et ZOVIC Guiaro et Po (55) (Indicateur de base 1.2 de FEM-7)				
	Ind 2.2.1.b: Superficie de l'aire protégée nouvellement créée (Corridor # 2) (Indicateur de base 1.1 de FEM-7)	0	0	0	
	Ind 2.2.2 Nombre annuel de cas de conflits homme-faune dans les points chauds (identifiés la première année par l'évaluation rapide des systèmes SAFE), notamment les villages de Mantoingo, Zerboko, Yougoudri, Saro, Sia, Natiédougou, Boissa et Boala.	ND	-30%	ND	
	Ind 2.2.3 Nombre annuel moyen d'indications (preuves) directes et indirectes d'activités illicites enregistrées par sortie de patrouille, y compris les carcasses, les pièges, les rencontres visuelles et les arrestations de braconniers.	ND	-20%	ND	
	Ind 2.2.4 État des ressources dans les aires protégées, y compris les aires protégées par l'État, les ZOVIC et les corridors.	a) Abondance relative des mammifères de grande et moyenne taille, notamment le Bushbuck <i>Tragelaphus scriptus</i> et le Bohor Reedbuck <i>Redunca redunca</i> ;	ND	-0%	ND
		b) Abondance relative du petit gibier, y compris les tourterelles (diverses espèces), la pintade (<i>Numida meleagris</i>) et le francolin	ND	-0%	ND

Produit	Indicateur		Valeur de référence (2024)	2024		Explication des écarts ou bonnes pratiques
				Cible	Situation	
		(Francolinus bicalcaratus)				
		c) Niveau d'invasion des AP par le bétail domestique	ND	-20%	ND	
Résultat 3 : Gestion durable des terres et diversification des moyens de subsistance						
<u>Produit 3.1</u> : une gestion intégrée agro-sylvo-pastorale efficace des ressources naturelles et agricoles, et d'une agriculture intelligente face au climat par les communautés locales au sein du paysage PONASI est adoptée	Ind 3.1 .1 Superficie des terres faisant l'objet de pratiques de gestion agro-sylvo-pastorales améliorées et d'une agriculture intelligente face au climat), y compris :	a) superficie des terres agro-pastorales aménagées (superficie totale : 6000 ha dans les sites pilotes)	0 Ha	a) 1 500 ha	ND	
		b) les forêts communales et villageoises et les massifs forestiers (superficie totale : 39 783 ha)	0 Ha	b) 9 946 ha	ND	
		c) les zones de pâturage soumises à des outils de gestion consensuels (superficie totale : 52 886 ha)	0 Ha	c) 13 221 ha	ND	
		d) les Chantiers d'Aménagement Forestier dont le modèle est évalué, révisé et mis en œuvre (superficie totale : 73 969 ha)	0 Ha	d) 18 492 ha	ND	
	Ind 3.2.1: Revenu individuel annuel	a. du tourisme lié aux aires protégées	ND	+30%	ND	

Produit	Indicateur		Valeur de référence (2024)	2024		Explication des écarts ou bonnes pratiques
				Cible	Situation	
<u>Produit 3.2:</u> Moyens de subsistance des communautés locales sont diversifiés à travers le développement du tourisme et aux filières basées sur les produits forestiers ;	moyen dans les communautés locales et nombre de bénéficiaires directs (ventilés par genre) de l'emploi dans les filières des PFNL et du tourisme	b. des filières du karité, de la liane goïne et du miel	ND	Karité +20% Liane+50% Miel+20%	ND	
	Ind 3.2.2 État des ressources	a. Zones forestières, y compris les zones de gestion forestière (CAF), les communes et les forêts villageoises	ND	Maintien ou amélioration	ND	
		b. Zones de pâturage	ND	Maintien ou amélioration	ND	
Résultat 4 : Intégration de la dimension de genre, et gestion des connaissances et apprentissage						
<u>Produit 4.1:</u> les opportunités pour les femmes de bénéficier de la gestion durable des ressources naturelles et des filières liées aux aires protégées dans le paysage PONASI ont augmenté	Ind 4.1 : Représentativité des femmes dans le dispositif de gouvernance collaborative et participation à la prise de décision sur l'utilisation des terres et des ressources.		ND	30%	ND	
<u>Produit 4.2:</u> les connaissances développées dans le projet PONASI par les différents acteurs du paysage PONASI et du Burkina Faso sont appropriées	Ind 4.2 : Proportion de groupes/associations villageois qui appliquent les connaissances partagées dans le cadre du projet, en dehors des sites d'intervention pilotes.		0%	20%	ND	

Annexe 3 : Recommandations : PQA, SESP, COPIL, audit et autre du projet

Faire brève résumé des recommandations et fournir le lien.

Recommandations : PQA, SESP, COPIL, audit et autre	Situation de mise en œuvre des recommandation	Observations

Annexe 4 : Le rapport financier CDR du projet disponible à la date de la revue ;

Partie responsable/	ID du fonds	Nom du donateur	Code de compte	Description du budget ATLAS	Montant prevue	Montant engagé	Taux 2024	Montant Revue	Montant	Montant	Montant	Montant	Total (USD)	Voir la note	Taux d'engagement global
(Agent de mise en œuvre d'Atlas)			budgétaire		Année 1	Année 1	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6		budgétaire	Année 1
			Atlas		(USD)		64,37	(USD)	(USD)	(USD))	(USD)	(USD)		:	8, 16
Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement	62000	FEM	71200	Cons internationaux	31000	134	0,43	48 000	14000	7000	0	0	100 000	1	00,13
			71300	Consultants locaux	14750	49	0,33	37 750	16500	0	0	9500	78 500	2	0,06
			71400	Contr. serv. Ind.	3500	76	2,17	24 925	14400	14400	14400	14400	86 025	3	0,09
			71600	Voyage	1500	32	2,13	33 300	7900	6300	1500	3100	53 600	4	0,06
			72200	Equip Furniture	0	0							0	5	
			72100	Contr. serv. Cies	0	0		98 000	0	0	0	0	98 000	6	
			72800	Info. Tech. Equip.	0	0		8 500	0	0	0	7500	16 000	7	
			74200	Audiov. print prod.	0	0		5 000	0	0	0	0	5 000	8	

			74500	Divers	8000	8000	100	12 000	10000	10000	10000	10000	60 000	9	13,33
			75700	Atelier de form, conf	5800	1587	27,36	9 000	3200	2200	2200	2200	24 600	10	6,45
			Sous-total FEM		64 550	9 878	22,07	276 475	66 000	39 900	28 100	46 700	521 725		1,89
PNUD	4000	TRAC	71600	Voyage	2000	2000	100	2 000	2000	2000	2000	2000	12 000	10	16,67
			71400	Contr. serv. Ind.	0	0		7 500	7500	7500	7500	7500	37 500	11	
			72200	Equip. Meubles	0	0		18 000	0	0	0	0	18 000	12	
				Sous-total PNUD	2000	2000	100	27500	9 500	9 500	9 500	9 500	67 500		2,96
				Total Résultat 1	66 550	11 878	17,85	303975	75 500	49 400	37 600	56 200	589 225		2,02
Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement	62000	FEM	71200	Cons internationaux	41200	12692	30,81	108800	72000	20000	0	0	242000	13	5,24
			71300	Consultants locaux	4000	17	0,43	103600	51050	30800	37800	0	227 250	14	0,01
			71400	Contr. serv. Ind.	27500	12691	46,15	68925	70400	50400	14400	22400	254 025	15	5,00
			71600	Voyage	20360	20258	99,50	31820	33780	25500	11500	1500	124 460	16	16,28
			72100	Contr. serv.	5000	5000	100	75000	260000	72000	0	10000	422000	17	1,18
			72200	Equip.	165200	164611	99,64	0	215400	104000	4000	4000	492600	18	33,42
			72300	Matériel et marchandises	25000	25000	100	10000	155000	145000	145000	0	480 000	19	5,21
			72800	Info. Equip.Tech.	95000	95000	100	5000	0	0	0	0	100000	20	95,00
			74200	Audiov. print prod.	0	0		10000	0	20000	20000	0	50 000	21	
			74500	Divers	13000	9017	69,36	17220	13000	13000	13000	13000	82 220	22	10,97
			75700	Atelier de form. conf	2000	2000	100	97000	55000	65000	5000	5000	229 000	23	0,87
				Sous-total FEM	398260	346286	74,59	527365	925 630	545 700	250 700	55 900	2 703 555		12,81
PNUD	4000	TRAC	71600	Voyage	2000	2000	100	2 000	2000	2000	2000	2000	12 000	24	16,67
			71400	Contr. serv. Ind.	0	0		7500	7500	7500	7500	7500	37 500	25	

			72200	Equip. Meubles	16000	16000	1,0000	2000	0	0	0	0	18000	26	88,89
				Sous-total PNUD	18 000	18 000	100	11 500	9 500	9 500	9 500	9 500	67 500		26,67
				Total Résultat 2	416 260	364 286	87,51	538 865	935 130	555 200	260 200	65 400	2 771 055		13,15
Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement	62000	FEM	71200	Cons internationaux	0	0		14000	14000	24500	0	0	52 500	27	
			71300	Consultants locaux	0	0		54000	32000	20000	20000	0	126 000	28	
			71400	Serv. Contrat. Ind.	8775	731	8,33	39150	39150	46650	27150	9150	170 025	29	0,43
			71600	Voyage	0	0		29020	1500	7880	3740	1500	43 640	30	
			72100	Contr services cles	0	0		0	162000	25000	0	0	187 000	31	
			72200	Equip. Meubles	9200	9200	100	15000	129800	0	0	0	154 000	32	5,97
			72600	Subventions	0	0		0	100000	200000	100000	0	400 000	33	
			74200	Audio. Impr. Prod	0	0		0	15000	15000	10000	0	40 000	34	
			74500	Divers	4000	17	0,43	32000	16000	16000	16000	14582	98 582	35	0,02
			75700	Atelier de form. Conf	0	0		1200	0	0	0	0	1 200	36	
				Sous-total FEM	21 975	9 948	36,25	184 370	509 450	355 030	176 890	25 232	1 272 947		0,78
PNUD	4000	TRAC	71600	Voyage	2000	2000	100	2000	2000	2000	2000	2000	12 000	37	16,67
			71400	Contr. serv. Ind.	0	0		7500	7500	7500	7500	7500	37 500	38	
			72200	Equip. Meubles	13000	13000	100	5000	0	0	0	0	18 000	39	72,22
				Sous-total PNUD	15 000	15 000	100	14 500	9 500	9 500	9 500	9 500	67 500		22,22
				Total Résultat 3	36 975	24 948	67,47	198 870	518 950	364 530	186 390	34 732	1 340 447		1,86
Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement	62000	FEM	71200	Cons internationaux	0	0		0	16250	0	0	19600	35 850	40	
			71300	Consultants locaux	0	0		0	5000	0	0	5600	10 600	41	

			71400	Contrat. Serv. Ind.	91875	30966	33,70	32250	32250	32250	32250	32250	253 125	42	12,23
			71600	Voyage	4500	3682	81,82	4500	16100	9500	9500	4500	48 600	43	7,58
			72100	Contr serv. Cies	8000	163	2,04	7000	5000	10000	15000	5000	50 000	44	0,33
			72220	equip furniture	0	0								46	
			74100	Profession. Serv.	0	0		4000	9000	4000	4000	9000	30 000	45	
			74200	Audio. Impr. Prod	8000	33	0,41	4000	4000	14000	14000	14000	58 000	46	0,06
			74500	Divers	10498	0	0	13498	3000	3000	3000	13000	35 498	47	00
			75700	Atelier de form. Conf	5000	3000	60,00	2000	1500	1500	1500	1500	13 000	48	23,08
				Sous-total FEM	127 873	37 844	29,66	26 750	102 100	84 250	89 250	104 450	534 673		7,08
PNUD	4000	TRAC	71600	Voyage	0	0		4000	2000	2000	2000	2000	12 000	49	
			71400	Contr. serv. Ind.	0	0		7500	7500	7500	7500	7500	37 500	50	
			72200	Equip. Meubles	13000	13000	100	5000	0	0	0	0	18 000	51	72,22
				Sous-total PNUD	13 000	13 000	100	16 500	9 500	9 500	9 500	9 500	67 500		19,26
				Total Résultat 4	140 873	50 844	36,09	83 250	101 600	83 750	78 750	113 950	602 173		8,44
Ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement	62000	FEM	71400	Serv. Contrat. Ind.	20800	0	00	60800	40800	22800	22800	2800	170 800	52	00
			71600	Voyage	1500	32	2,13	1500	1500	1500	1500	1500	9 000	53	0,36
			72200	Equip. Meubles	8000	173	2,16	3000	3000	3000	3000	3000	23 000	54	0,75
			72500	Fournitures de bureau	3250	70	2,15	1500	1500	1500	1500	1500	10 750	55	0,65
			72800	Info. Equip. Tech.	6000	423	7,05	300	300	300	300	300	7 500	56	5,64
			74500	Divers	3000		00	500	500	500	500	502	5 502	57	00
			74100	Services professionnels	0	0		4000	4000	4000	4000	4000	20 000	58	

	Gestion		totale		42 550	698	1,64	71 600	51 600	33 600	33 600	13 602	246 552		0,28
			SOUS-TOTAL FEM		655 208	404 654	61,76	1 116 560	1 644 780	1 048 480	568 540	245 884	5 279 452		7,66
			SOUS-TOTAL PNUD		48 000	48 000	100	70 000	38 000	38 000	38 000	38 000	270 000		17,78
			TOTAL PROJET		703 208	452 654	64,37	1 182 560	1 678 780	1 082 480	602 540	299 884	5 549 452		8,16

Annexe 5 : Situation Quantum Transparency Dashboard

NOTE: Please, note that the dashboard has been updated to show 2024 data

Status Overview Fiscal Year 2024

Bureau: RBA Operating Unit: Burkina Faso Project Number: 00096170 Report Refresh Date: janvier 8, 2025

Clear all slicers Guidance

0 Projects with short title	0 Projects without description	0 Project with short description	0 Projects without IP	0 Projects without Prodod	0 Projects without type
0 Wrong project structure	0 Task with short title	0 Tasks without descriptions	0 Tasks with short description	0 Tasks without gender marker	0 Tasks without SDG
0 Tasks without indicators	0 Tasks without 2023 actuals	0 Tasks not linked to CPDs	0 Tasks without location	0 Tasks without OECD se...	

✎ 📄 🔔 ≡ 🗨 ...

Bureau	Operating Unit	Total no. of Projects	Project title with less than 10 characters	Projects without description	Projects with description less than 80 characters	Projects without implementing partner	Projects without Prodod	Projects without project type	Projects with wrong structure
RBA	Burkina Faso	1	0	0	0	0	0	0	0
Total		1	0	0	0	0	0	0	0
